

KPI Controller - Planta Compresora APO

Área: APO/ ACAs

ID: 22.23.APO

Tipo de Proyecto: DDR

Líder: Pablo Luraschi

Coord.: Juan Jose Oubiña

IP: Julieta Kohashi

Fecha Inicio LE

03/01/2022

Inicio de Obra

18/10/2022

RFSU LE

30/04/2023

86

Días Inicio Obra


En licitación

280

Días p/ RFSU


CAPEX

Línea de Base PA + REAL/LE 2022

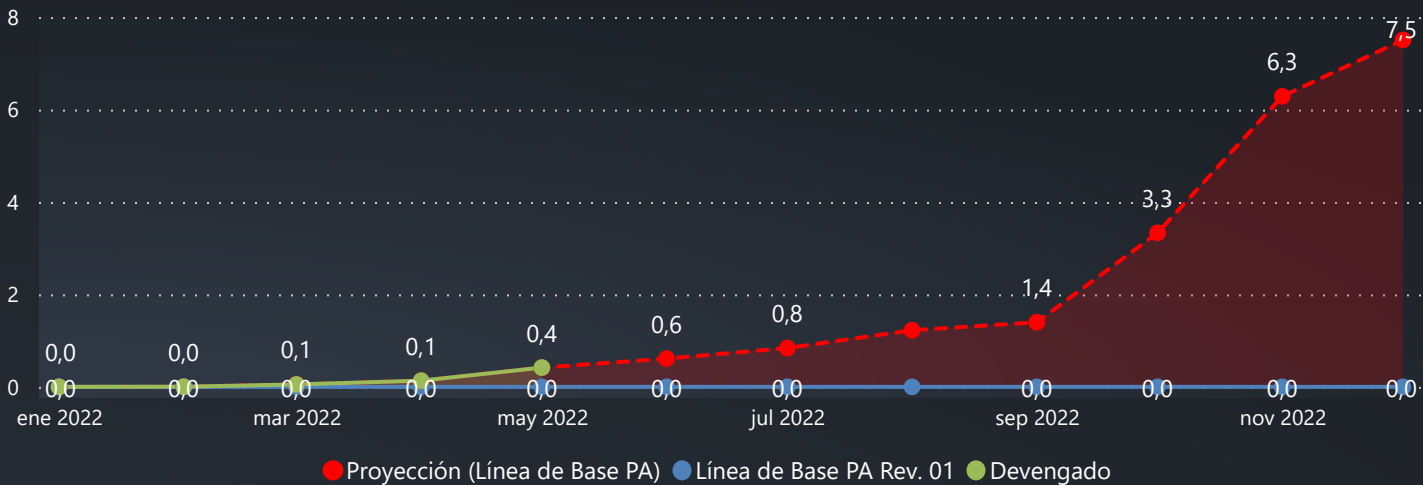


RECURSOS

Recursos 2022

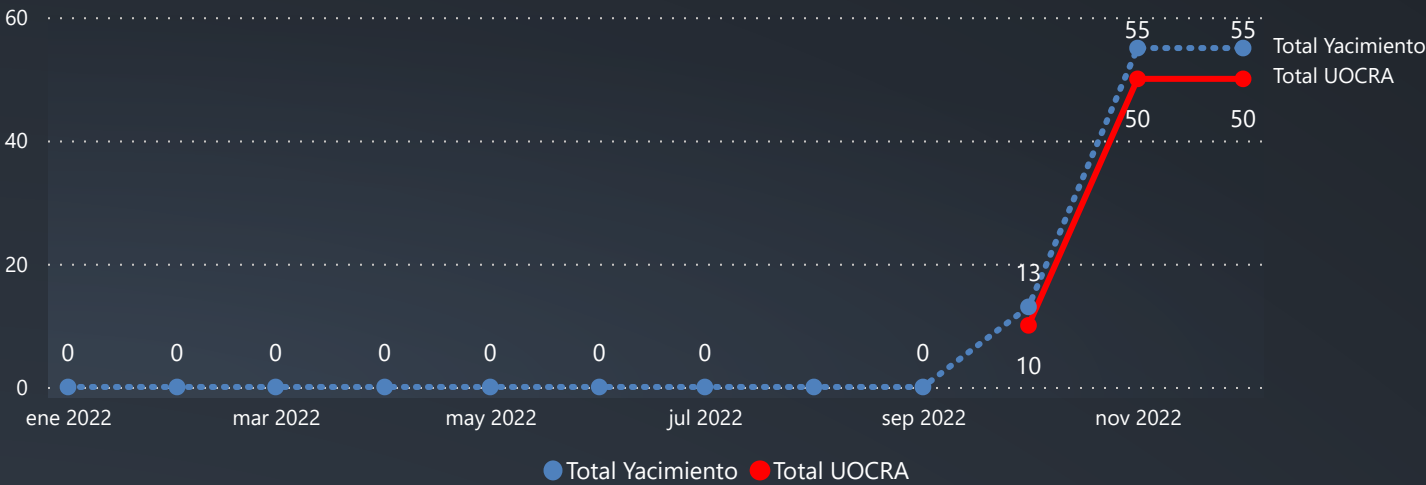


EQUIPOS & MATERIALES

Solpeds sin Tratar

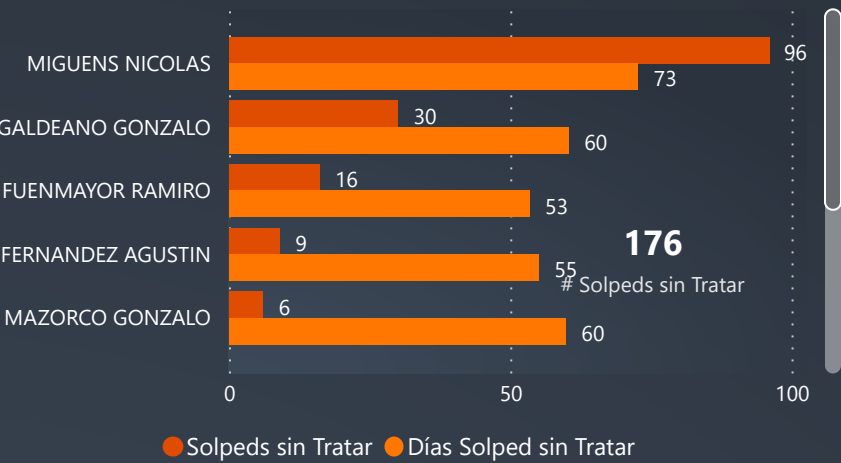

Items por Status

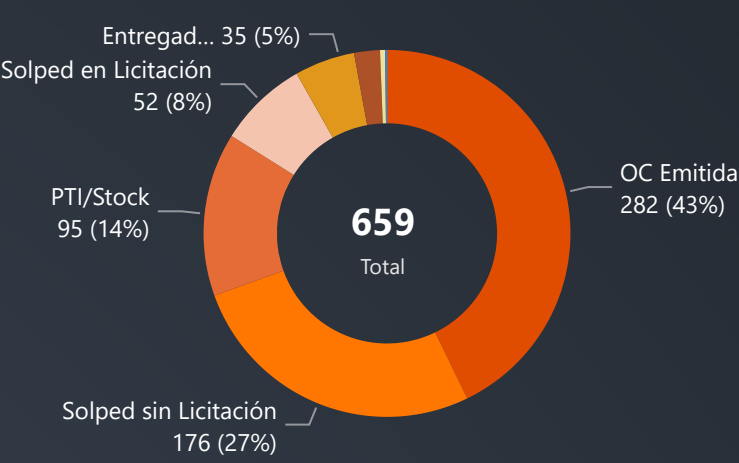

23

Pedidos

659

Items


100 %

% Carga Reservas

0.44

Avg Días Reservas

Días Licitación por Items

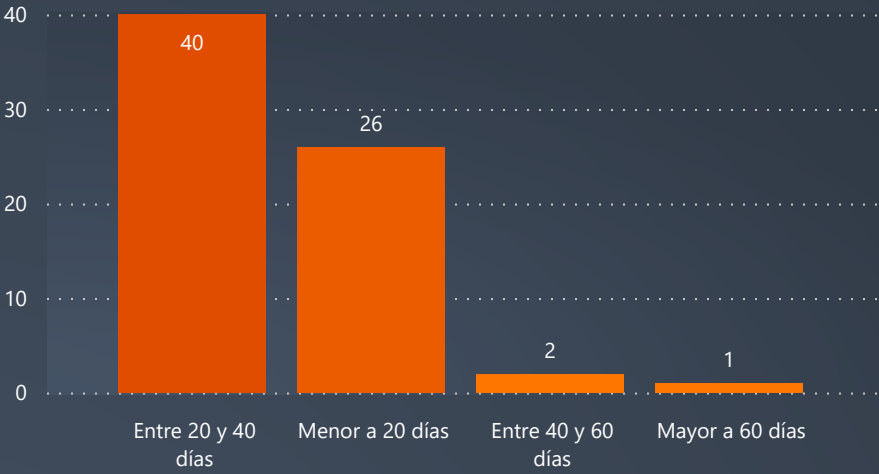

FECHAS Y AVANCE

Fecha Inicio Budget

03/01/2022

Fecha Inicio LE

03/01/2022

Inicio de Obra

18/10/2022

Fecha RFSU Budget

30/04/2023

RFSU LE

30/04/2023
