


Tablero de Seguimiento - Requerimientos de E&M



Sin Entregados


		Area			Planificador									Tipo			
ACA	APO/ACAs	BCE	CASE	LA	>	Federico Sai	nchez Maximiliano N	Moyano	Nicolás Saravia	a Pat	tricia Fuentealba	Early App	proval	Proyecto	WF		
ID Pedido	IP		Proyecto		Descripciór	n Material	Cod. Material	Solped-Po	sición [Pedido/Posi	ción Statu	S		364	2429		
Todas	Todas	<u> </u>	Todas	\	Todas	\	Todas	Todas	\	Todas	V Toda	s		# Pedidos	# Items		
Proyecto				ID	Área	Fecha de Creación	n Fecha de Modificación	r Fecha de I	Necesidad Nece	esidad vs O	C Provecto/Stock/	FA ID Provecto	PFP		Grafo	Fa	
·	4.00					▼								. (04.63.F. 03.030		-9	
312.1.Planta Compre				312	APO/ACAs	15/07/2022	15/07/2022	13/09/202			Proyecto	22.23.APO		0/0163.5.03.028	2000032810		
312.16.Planta Compr				312	APO/ACAs	15/07/2022	15/07/2022 15/07/2022	13/09/202			Proyecto	22.23.APO)/0163.5.03.028	2000032810		
312.2.Planta Compre				312 312	APO/ACAs APO/ACAs	15/07/2022 15/07/2022	15/07/2022 15/07/2022	13/09/202			Proyecto	22.23.APO 22.23.APO		0/0163.5.03.028	2000032810 2000032810		
312.3.Planta Compre				312	APO/ACAS APO/ACAs		15/07/2022 15/07/2022	13/09/202			Proyecto)/0163.5.03.028 ./0163.5.03.028			
312.4.Planta Compre 312.5.Planta Compre				312	APO/ACAS APO/ACAs	15/07/2022 15/07/2022	15/07/2022 15/07/2022	13/09/202 13/09/202			Proyecto Proyecto	22.23.APO 22.23.APO)/0163.5.03.028)/0163.5.03.028	2000032810 2000032810		
312.6.Planta Compre				312	APO/ACAS APO/ACAs	15/07/2022	15/07/2022	13/09/202			Proyecto	22.23.APO 22.23.APO)/0163.5.03.028)/0163.5.03.028	2000032810		
312.7.Planta Compre				312		15/07/2022	15/07/2022	13/09/202			Proyecto	22.23.APO		/0163.5.03.028	2000032810		
312.8.Planta Compre				312		15/07/2022	15/07/2022	13/09/202			Proyecto	22.23.APO		/0163.5.03.028	2000032810		
312.9.Planta Compre				312	APO/ACAs	15/07/2022	15/07/2022	13/09/202			Proyecto	22.23.APO		/0163.5.03.028	2000032810		
310.1.Cargadero de A		-03 v Calentamie	ento salida de crudo		LA	14/07/2022	14/07/2022	12/09/202		-5	9 Proyecto	22.04.LA		/0153.5.03.030	2000032779		
311.1.REVAMP EPF C	3	ob y caremanni		311	CASE	14/07/2022	14/07/2022	14/09/202			Proyecto	22.08.CASE		/0161.5.03.023	2000033269		
309.1.Instalación FO		APO-ACAS		309	APO/ACAs	13/07/2022	13/07/2022	16/09/202			Proyecto	22.06.APO		/0152.5.01.002	2000034700		
309.2.Instalación FO				309	APO/ACAs	13/07/2022	13/07/2022	16/09/202			Proyecto	22.06.APO		/0152.5.01.002	2000034700		
140.3.Red de Captaci				140	LA	12/07/2022	12/07/2022	01/09/202			Proyecto	22.16.LA		/0153.5.03.034	2000033314		
307.1.Colectores Prod		- Zona A		307	LA	12/07/2022	12/07/2022	10/09/202			Proyecto	20.37.LA		0/0153.5.03.012	2000022874		
308.1.Batería APO1				308	APO/ACAs	12/07/2022	12/07/2022	15/07/202			Proyecto	20.17.APO		0/0163.5.03.001	2000028643		
68.10.HOOK UP				68	Sin Datos	12/07/2022	12/07/2022	01/09/202	22		Early Approval	HOOK UP				Ma	
79.2.HOOK UP				79	ACA	12/07/2022	12/07/2022	01/09/202	22		Early Approval	HOOK UP				LLI	
304.1.Cargadero de A	Agua Bateria Ech	-03 y Calentamie	ento salida de crudo	304	LA	11/07/2022	11/07/2022	09/09/202	22	-5	8 Proyecto	22.04.LA	EARAD	/0153.5.03.030	2000032779	9 Ma	
305.1.Gathering Bate	ería APO1			305	APO/ACAs	11/07/2022	11/07/2022	11/07/202	22		Proyecto	20.25.APO	EARAD	/0163.5.03.016	2000028369	9 Ma	
303.1.Electrificación A	AIBs 2022 - ACA			303	ACA	07/07/2022	07/07/2022	13/07/202	22		Proyecto	22.04.ACA	EARAD	/0227.5.03.003	200003296	5 Ma	
303.2.Electrificación A	AIBs 2022 - ACA			303	ACA	07/07/2022	07/07/2022	13/07/202	22		Proyecto	22.04.ACA	EARAD	/0227.5.03.003	200003296	5 Ma	
303.3.Electrificación A	AIBs 2022 - ACA			303	ACA	07/07/2022	07/07/2022	13/07/202	22		Proyecto	22.04.ACA	EARAD	/0227.5.03.003	200003296	5 Ma	
303.4.Electrificación A	AIBs 2022 - ACA			303	ACA	07/07/2022	07/07/2022	13/07/202	22		Proyecto	22.04.ACA	EARAD	/0227.5.03.003	200003296	5 Ma	
303.5.Electrificación A	AIBs 2022 - ACA			303	ACA	07/07/2022	07/07/2022	13/07/202	22		Proyecto	22.04.ACA	EARAD	/0227.5.03.003	200003296	5 M a	
303.6.Electrificación A	AIBs 2022 - ACA			303	ACA	07/07/2022	07/07/2022	13/07/202	22		Proyecto	22.04.ACA	EARAD	/0227.5.03.003	200003296	5 Ma	
303.7.Electrificación A	AIBs 2022 - ACA			303	ACA	07/07/2022	07/07/2022	13/07/202			Proyecto	22.04.ACA		/0227.5.03.003	200003296		
278.1.WP009.APO				278		06/07/2022	06/07/2022	14/11/202			WF	WP009.APO		/0163.5.01.012.03			
278.2.WP009.APO				278	APO/ACAs		06/07/2022	14/11/202			WF			/0163.5.01.012.03			
279.1.WP009.APO				279		06/07/2022	06/07/2022	14/11/202			WF			0/0163.5.01.013.03			
279.2.WP009.APO				279		06/07/2022	06/07/2022	14/11/202			WF			/0163.5.01.013.03			
280.1.WP009.APO				280		06/07/2022	06/07/2022	14/11/202			WF			/0163.5.01.014.03			
280.2.WP009.APO				280	APO/ACAs	06/07/2022	06/07/2022	14/11/202	22		WF	WP009.APO		/0163.5.01.014.03			
200 2 14/0000 4 00				200	ADO /ACA	00 107 12022	00/07/2022	1 4 /1 1 /202	22		\	AVDOOD A DO		V01C2 F 01 01 4 02	200002050		

Estado de Pedidos

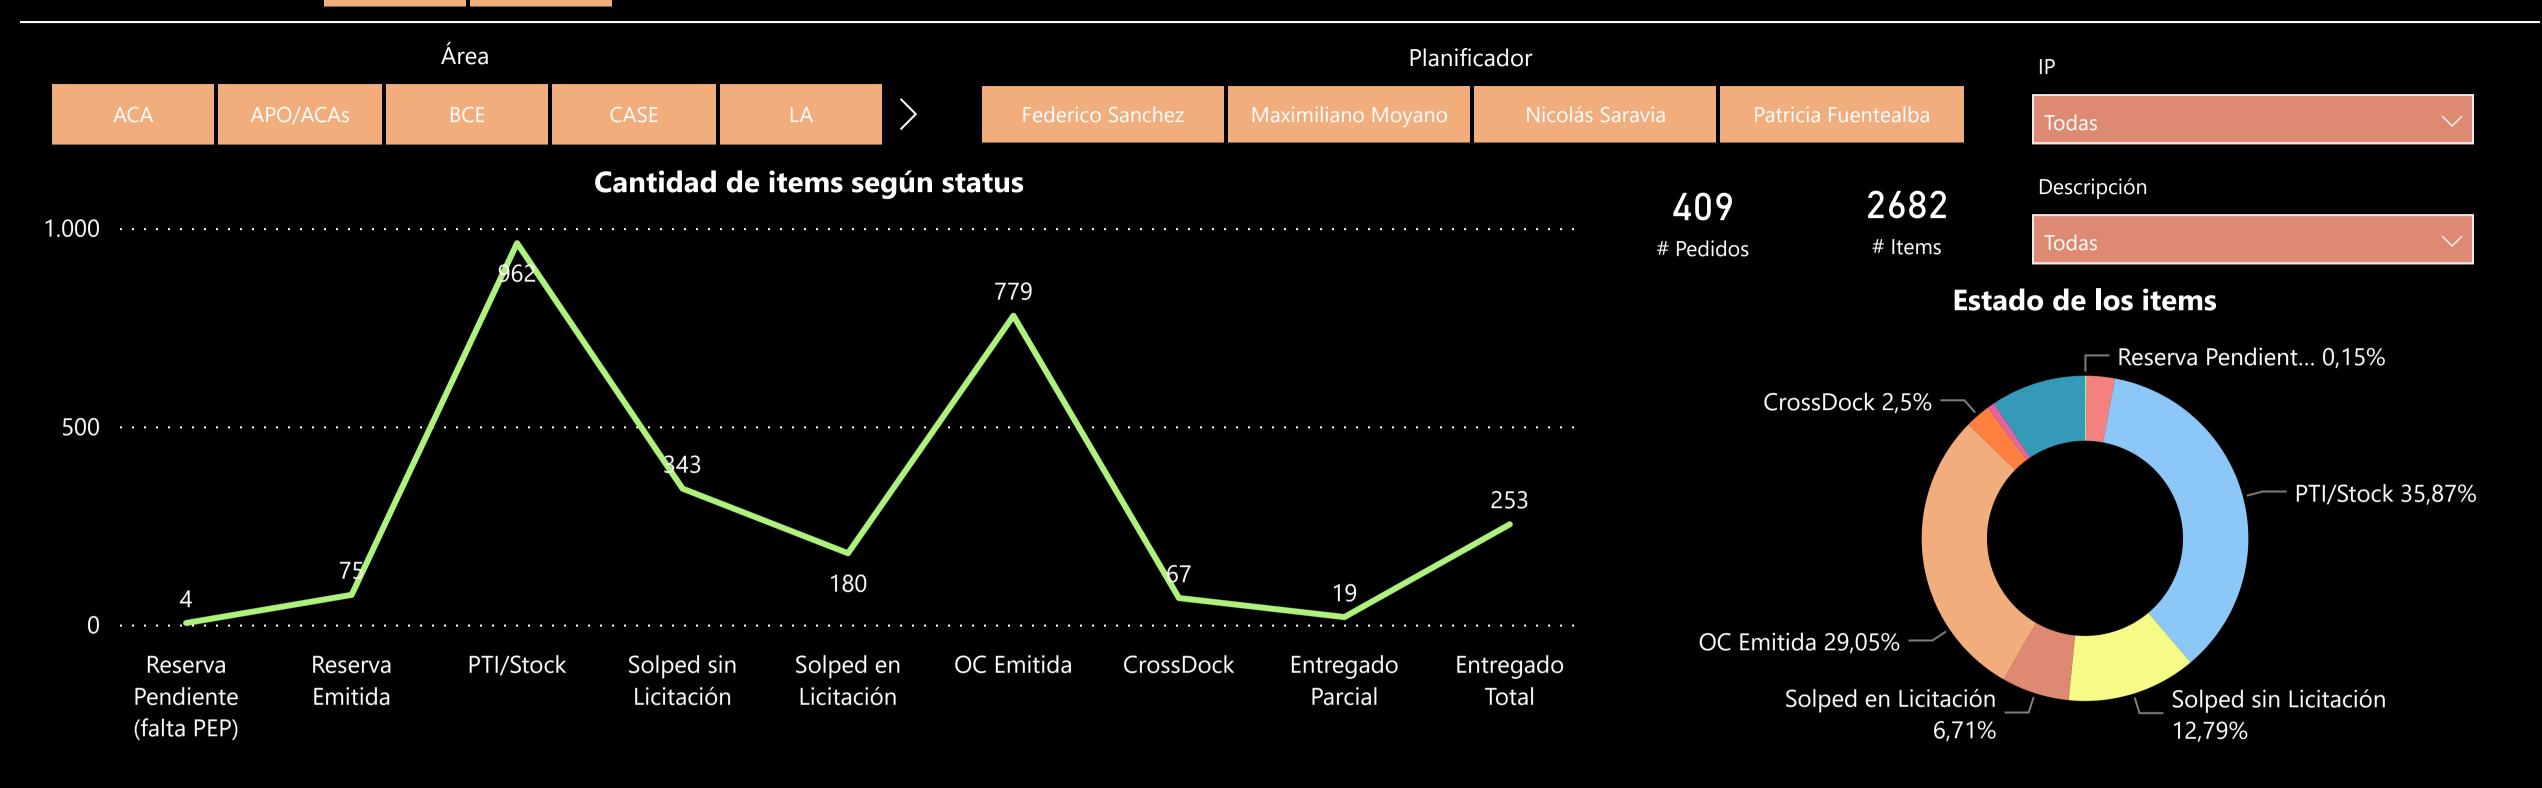


Descripcion	Cantidad UM	N° de Reserva	Solped-Posicion	Pedido/Posicion Comprador	Proveedor	Cantidad solicitada	CrossDock	Cant. Iransito	Cant. Yacımıento
	2,00	3476737- 7	1000225619-10	-			0	0	C
	2,00	3590515- 34	1000232673-10	-			0	0	C
CENTRO COMP D/TRANSF 3000KVA	1,00	3635027	1000222100-10	-			0	0	C
	3,00	3724847- 11	1000215431-10	-			0	0	C
	1,00	3766599-1	1000220552-10	-			0	0	C
	1,00	3977198- 1	1000222714-10	-			0	0	C
	1,00	3977198- 2	1000222714-20	-			0	0	C
VALV ESF MAN DIB-1 PR 6" 600 RF	2,00	4102032- 10	1000226786-70	-			0	0	C
	2,00	4102032- 11	1000226786-80	-			0	0	C
	2,00	4102032- 3	1000226786-20	-			0	0	C
	4,00	4102032- 6	1000226786-50	-			0	0	C
	1,00	4186503- 25	1000234440-90	-			0	0	C
VALV ESF MAN DIB-1 PR 12" 600 RF	2,00	4186503-13	1000231774-10	-			0	0	C
VALV ESF MAN DIB-1 PR 10" 600 RF	3,00	4186503-14	1000231774-20	-			0	0	C
	2,00	4186503-15	1000231774-30	-			0	0	C
	5,00	4186503-22	1000234440-70	-			0	0	C
	1.00	4186503-23	1000234440-80	-			0	0	

Indicadores

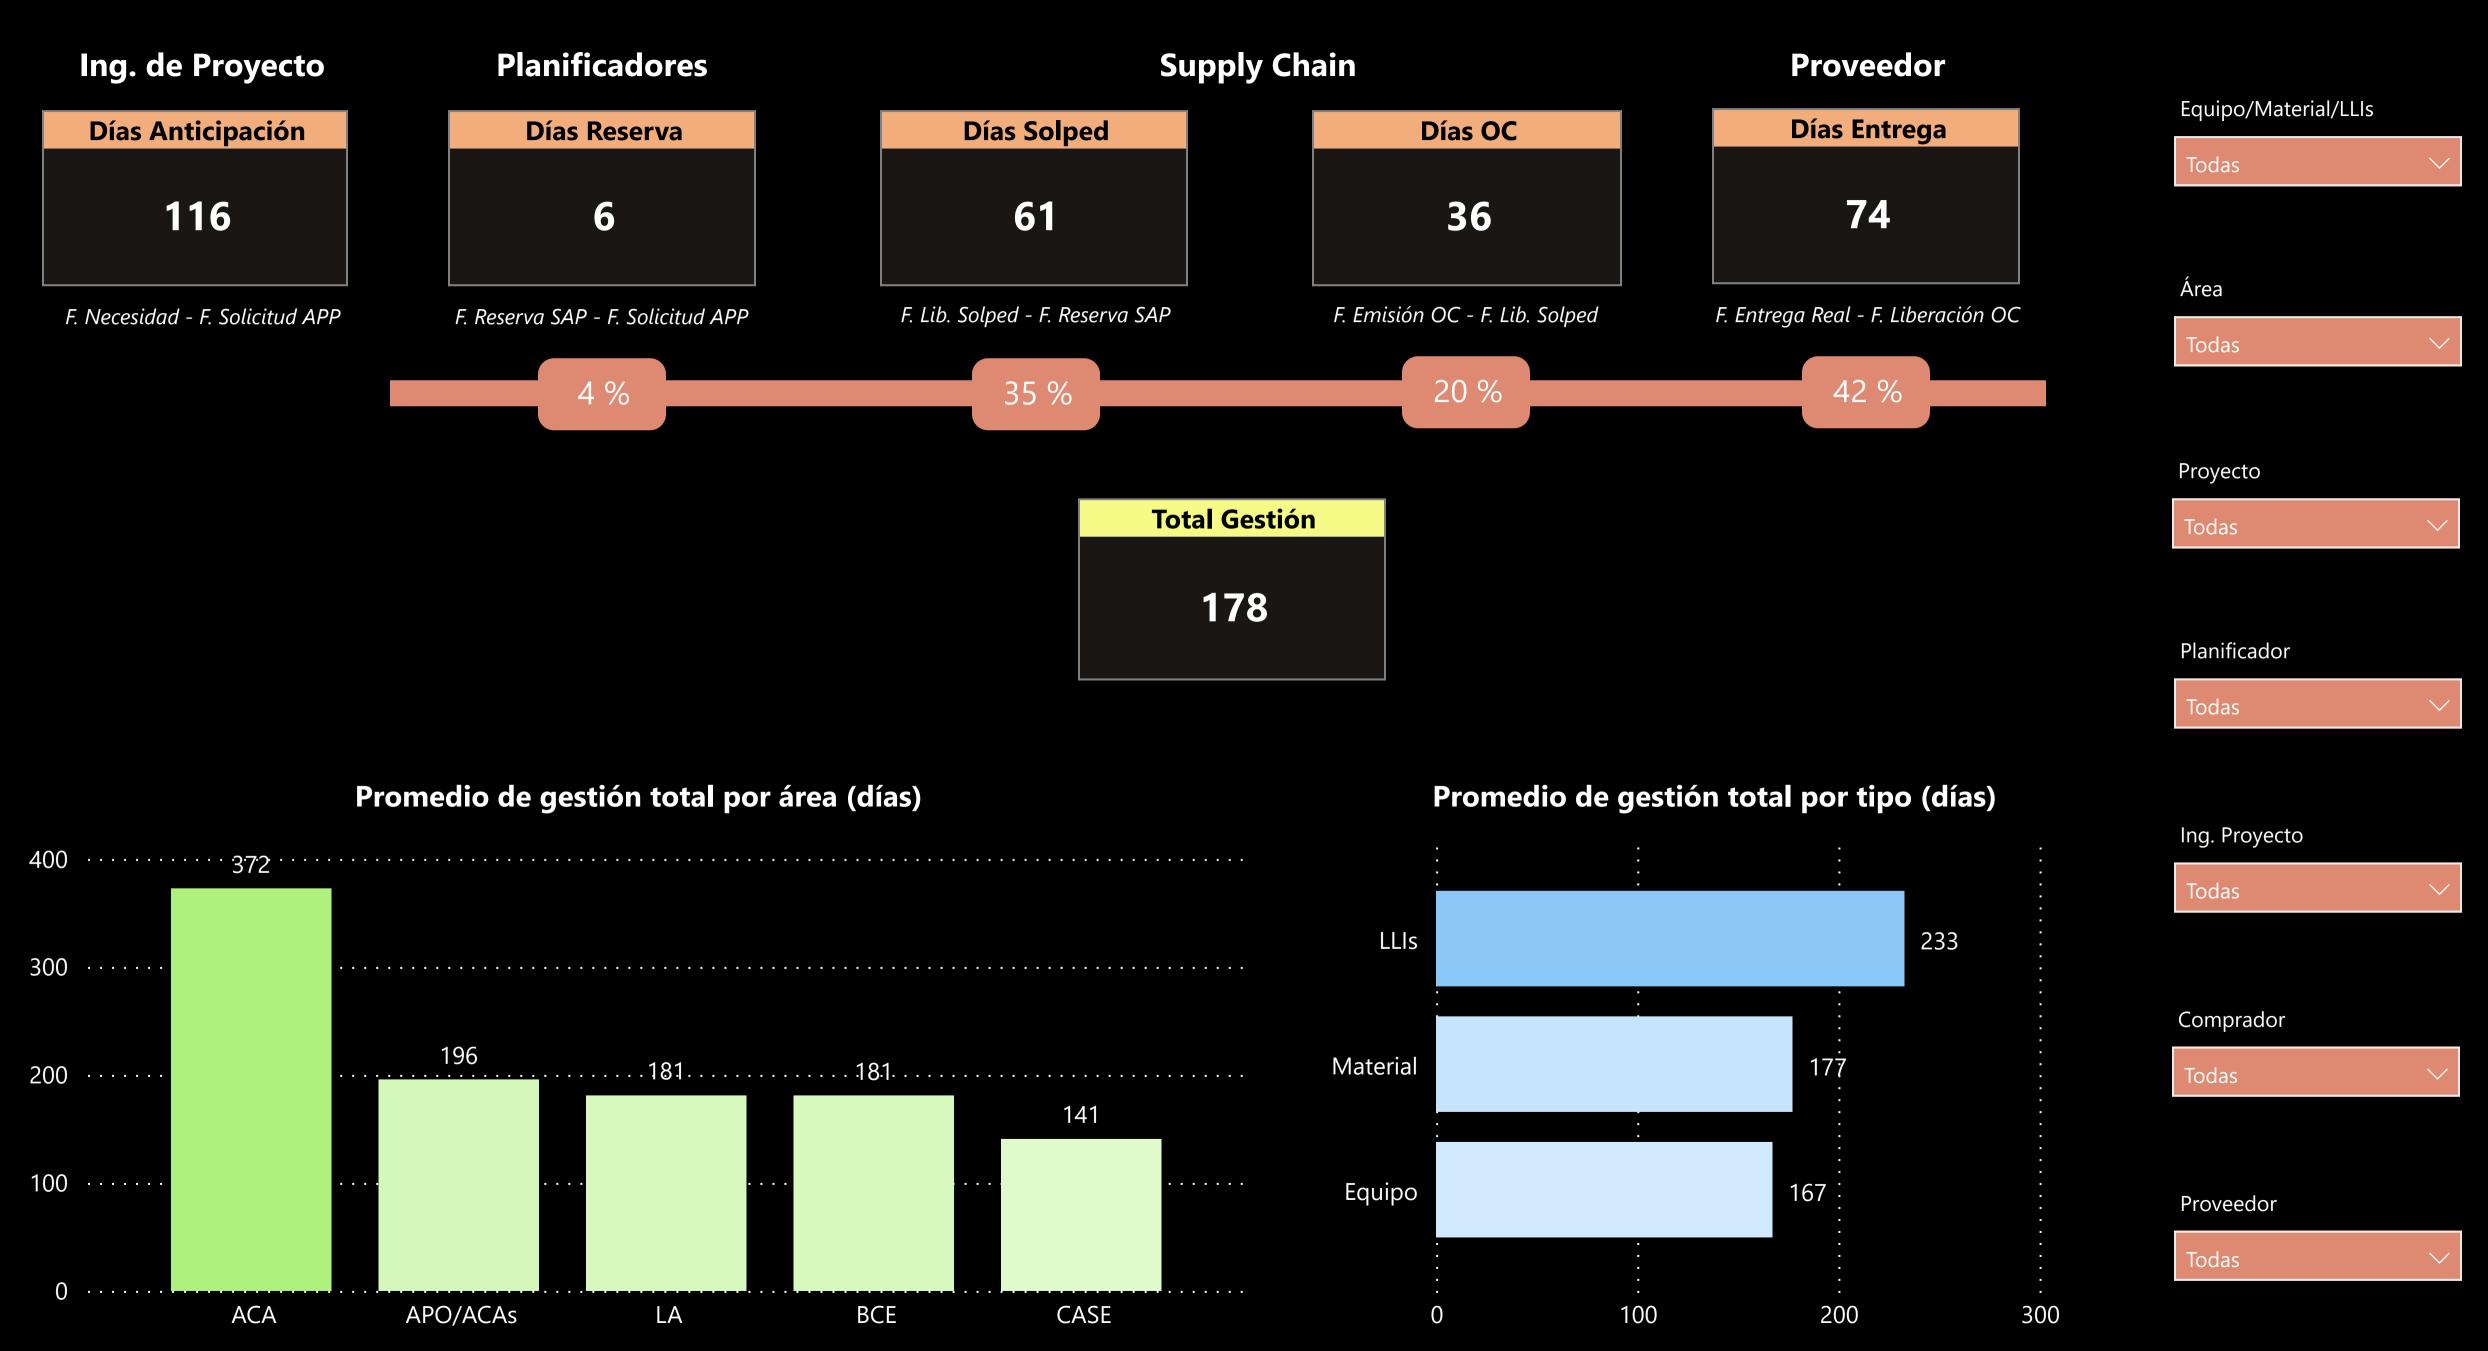

KPIs Proveedor

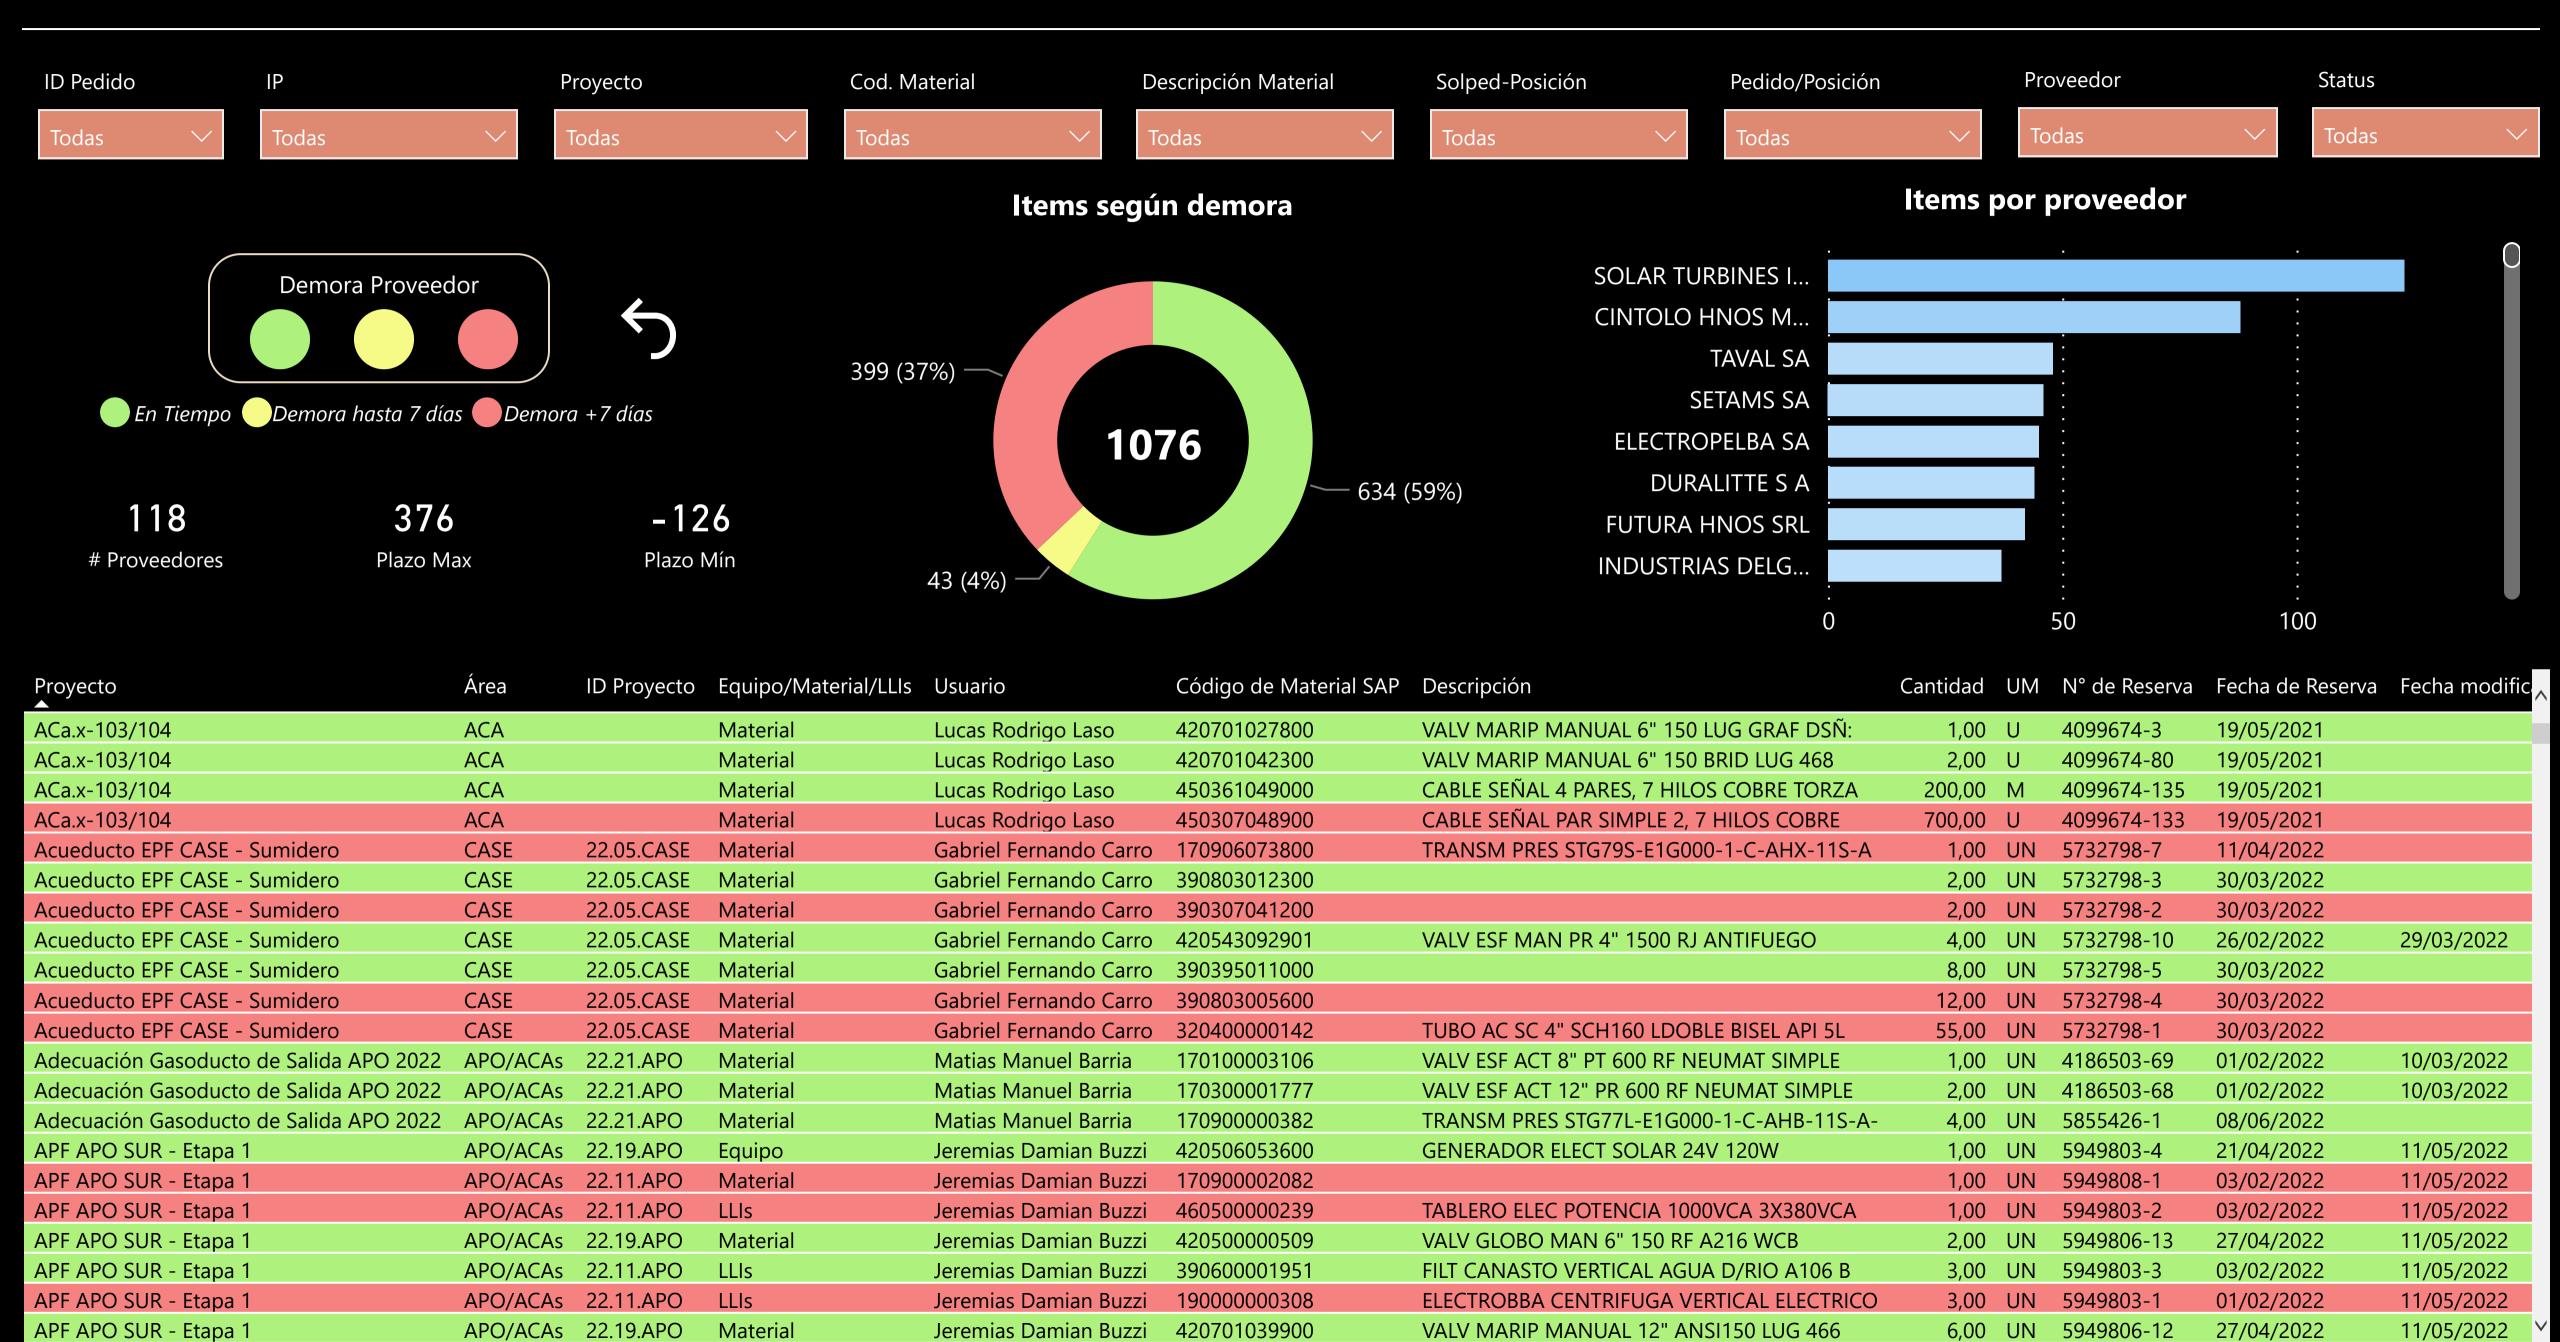

<

KPIs Compradores



Planificador

Federico Sanchez	Maximiliano Moyano	Nicolás Saravia	Patricia Fuentealba
------------------	--------------------	-----------------	---------------------

Reservas sin Solped

ID Pedido	Item Codigo de Materia	al SAP Descripción	Cantidad	UM	N° de Reserva	Fecha de Reserva	Días desde Reserva	Comentario		Fecha Último Se
41	1 160900000820	MANIFOLD MSO-001 HU	3,00	UN	5674426-8	01/02/2022	173	Well Facilities - Gestionado -		11/03/2022
72	5 160900000910	SKID 5 - GAS - LINEA GAS DE SERVICIO	1,00	UN	4973234-127	07/03/2022	139	No los veo en gestion mail 17	7/05	
73	5 160900000910	SKID 5 - GAS - LINEA GAS DE SERVICIO	1,00	UN	4973301-119	07/03/2022	139	Consultar Planificador Mail 17	7/05	
78	1 160900000821	MANIFOLD MSG-001 HU	4,00	UN	No Corresponde	09/03/2022	137			
78	3 160900000906	SKID 1 - CONEXION A POZO	9,00	UN	No Corresponde	09/03/2022	137	1 Un cada Pozo (APO-		07/06/2022
								114/115/116/209/210/211/12	26/127/128)	
78	4 160900000907	SKID 2 - DERIVACION A CALENTADOR/DESARENADOR	9,00	UN	No Corresponde	09/03/2022	137	1 Un cada Pozo (APO-		07/06/2022
								114/115/116/209/210/211/12	26/127/128)	
78	5 160900000908	SKID 3 - TOMA GAS DE SERVICIO	3,00	UN	No Corresponde	09/03/2022	137	1 Un cada Pozo (APO-209/21	0/211)	07/06/2022
78	7 160900000910	SKID 5 - GAS - LINEA GAS DE SERVICIO	2,00	UN	No Corresponde	09/03/2022	137	2 Un APO-209		07/06/2022
										>

Solped sin Licitación

ID Pedido	Item	Codigo de Material SAP	Descripción	Cantidad	UM	Solped-Posición	Fecha de liberación de Solped	Días desde Lib Solped ▼	Comentario	Fecha Último Seguin
55	3	860209010110	LICENCIA DE SOFTWARE; DENOMINACION IFIX STANDARD	1,00	UN	1000247626-20	07/04/2022	150		14/03/2022
			HMI 300 I/O RUNTIME							
75	61	321000003800	TUBO AC INOX SC 1/2" 0,89MM LSIMPLE PL A	64,00	UN	3000007361-30	13/03/2022	144		
72	1	160900000906	SKID 1 - CONEXION A POZO	1,00	UN	3000007390-40	16/03/2022	139	Falta entregar documentación	13/04/2022
									para Licitar.	
72	2	160900000907	SKID 2 - DERIVACION A CALENTADOR/DESARENADOR	1,00	UN	3000007391-40	16/03/2022	139	Consultar Planificador Mail 17/05	
72	3	160900000908	SKID 3 - TOMA GAS DE SERVICIO	1,00	UN	3000007393-10	16/03/2022	139	Consultar Planificador Mail 17/05	
73	1	160900000906	SKID 1 - CONEXION A POZO	1,00	UN	3000007390-50	16/03/2022	139	Falta entregar documentación	13/04/2022
									para Licitar.	
73	2	160900000907	SKID 2 - DERIVACION A CALENTADOR/DESARENADOR	1,00	UN	3000007391-50	16/03/2022	139	Consultar Planificador Mail 17/05	
73	3	160900000908	SKID 3 - TOMA GAS DE SERVICIO	1,00	UN	3000007393-20	16/03/2022	139	Consultar Planificador Mail 17/05	V

Solped sin OC

ID Pedido	item	Codigo de Material SAP	Descripcion	Cantidad	UM	Solped-Posicion	Fecha de liberación de Solped	# Licitacion	Fecha Cierre Lic.	Dias desde lib Solped ▼	Comentario
78	24	170300001482	Válvula 3 vías	15,00	UN	1000226002-10	24/06/2021	3000044360	23/05/2022		Se compran solo 12Un p
											tenemos 3 en Stock
88	1	170100003097	VALV GLOBO ACT 1" 600 RF DIAF Y RESOR	3,00	UN	1000241723-10	01/02/2022	3000043168	16/03/2022	173	En validación técnica.
											07/06/2022.
68	20	160500000084	Separador Trifásico	1,00	UN	1000242267-10	03/02/2022	3000042979	18/03/2022	171	No se compro aun (31.03
75	17	320304054100	TUBO AC SC 8" SCH80 LDOBLE BISEL API 5L	3,00	UN	3000007316-10	03/03/2022	3000043391	12/04/2022	143	
75	62	321000000012	TUBO AC INOX SC 1/2" 4,77MM LSIMPLE PL	20,00	UN	3000007316-10	03/03/2022	3000043391	12/04/2022	143	
72	83	321000000012	TUBO AC INOX SC 1/2" 4,77MM LSIMPLE PL	1,00	UN	3000007358-30	13/03/2022	3000043391	12/04/2022	133	
73	84	321000000012	TUBO AC INOX SC 1/2" 4,77MM LSIMPLE PL	2,00	UN	3000007358-40	13/03/2022	3000043391	12/04/2022	133	
74	86	321000000012	TUBO AC INOX SC 1/2" 4,77MM LSIMPLE PL	2,00	UN	3000007358-50	13/03/2022	3000043391	12/04/2022	133	<u> </u>
<											>
