

21	68	Plan	LE	Plan Acum.	Real Acum.	$\Delta C\%_{PA}$	$\Delta CM\%_{PA}$
Cant. WP	Cant. Pozos	9.40	9.53	2.87	3.48	1.4 %	21.3 %
		MMUSD	MMUSD	MMUSD	MMUSD		

Variación de la Cartera		
Costo	Alcance	Desliz
2.29 %	-0.86 %	0.00 %

Área




Todas


Well Pad

Todas

Pozo

Todas

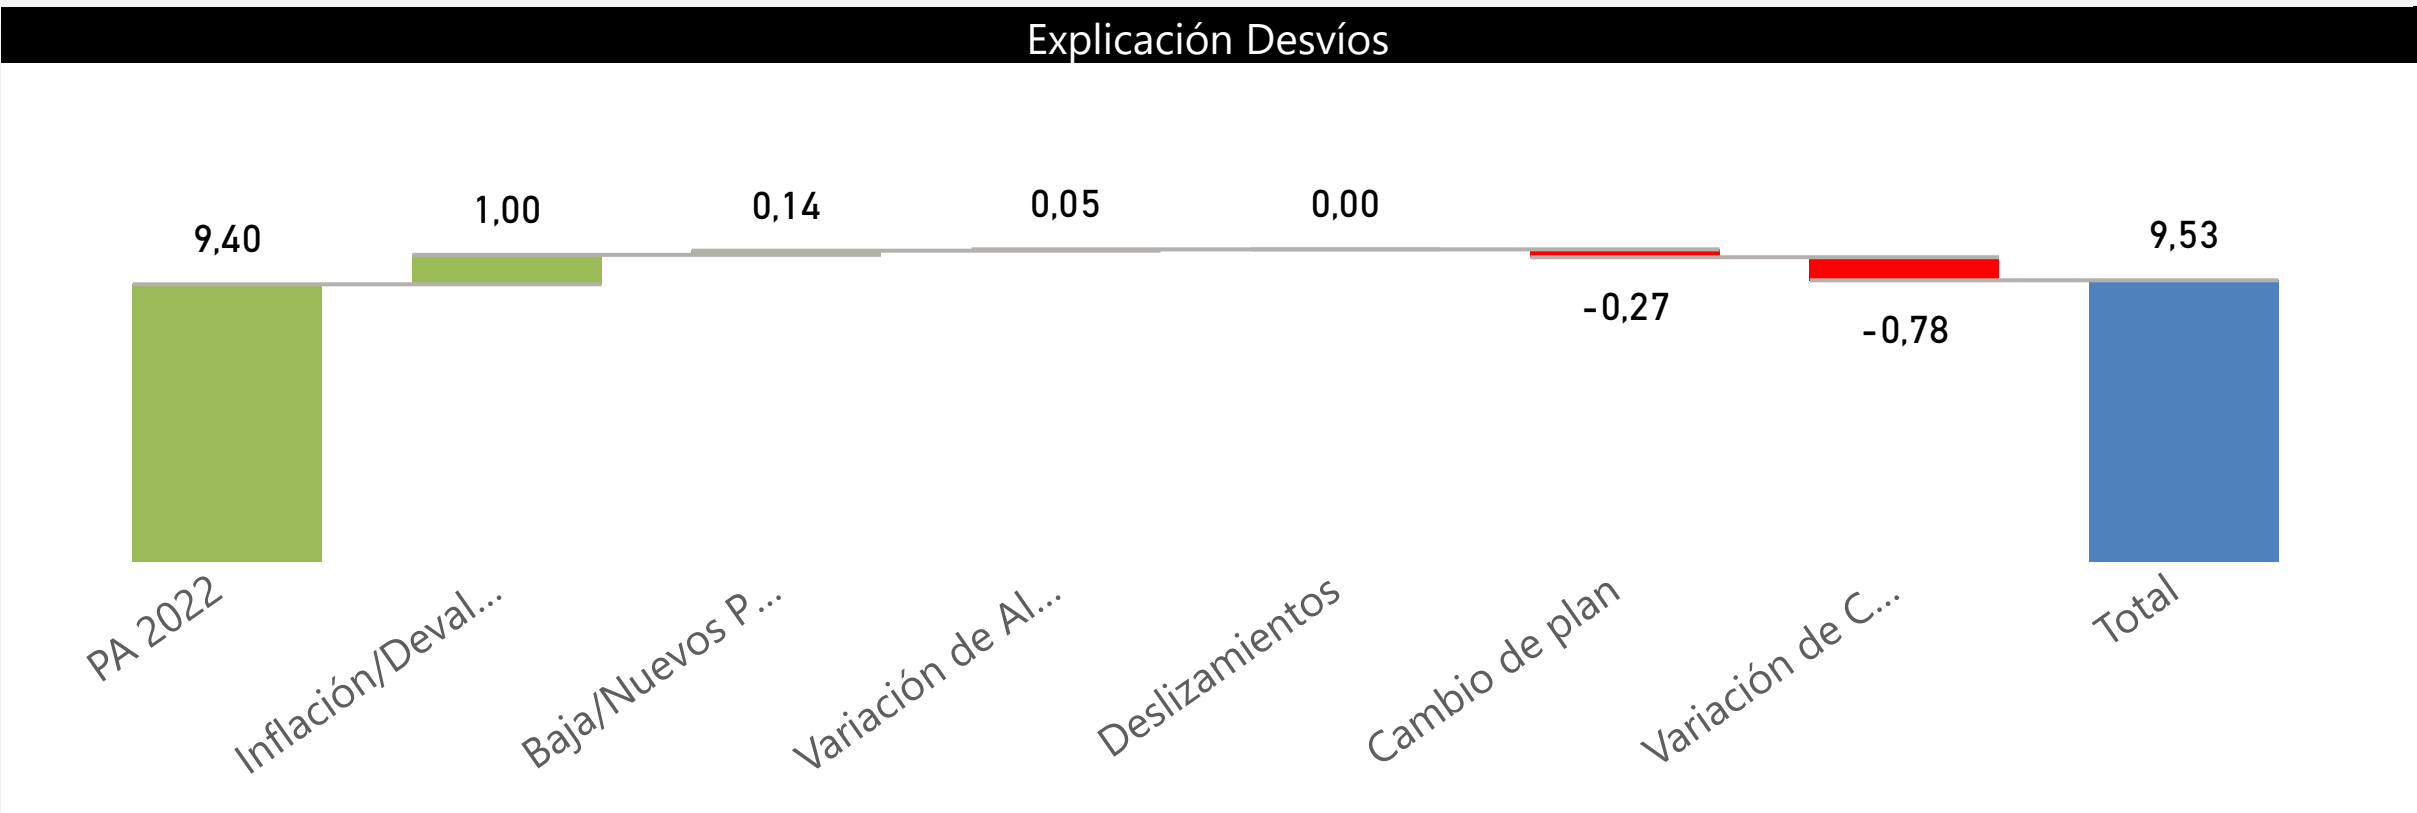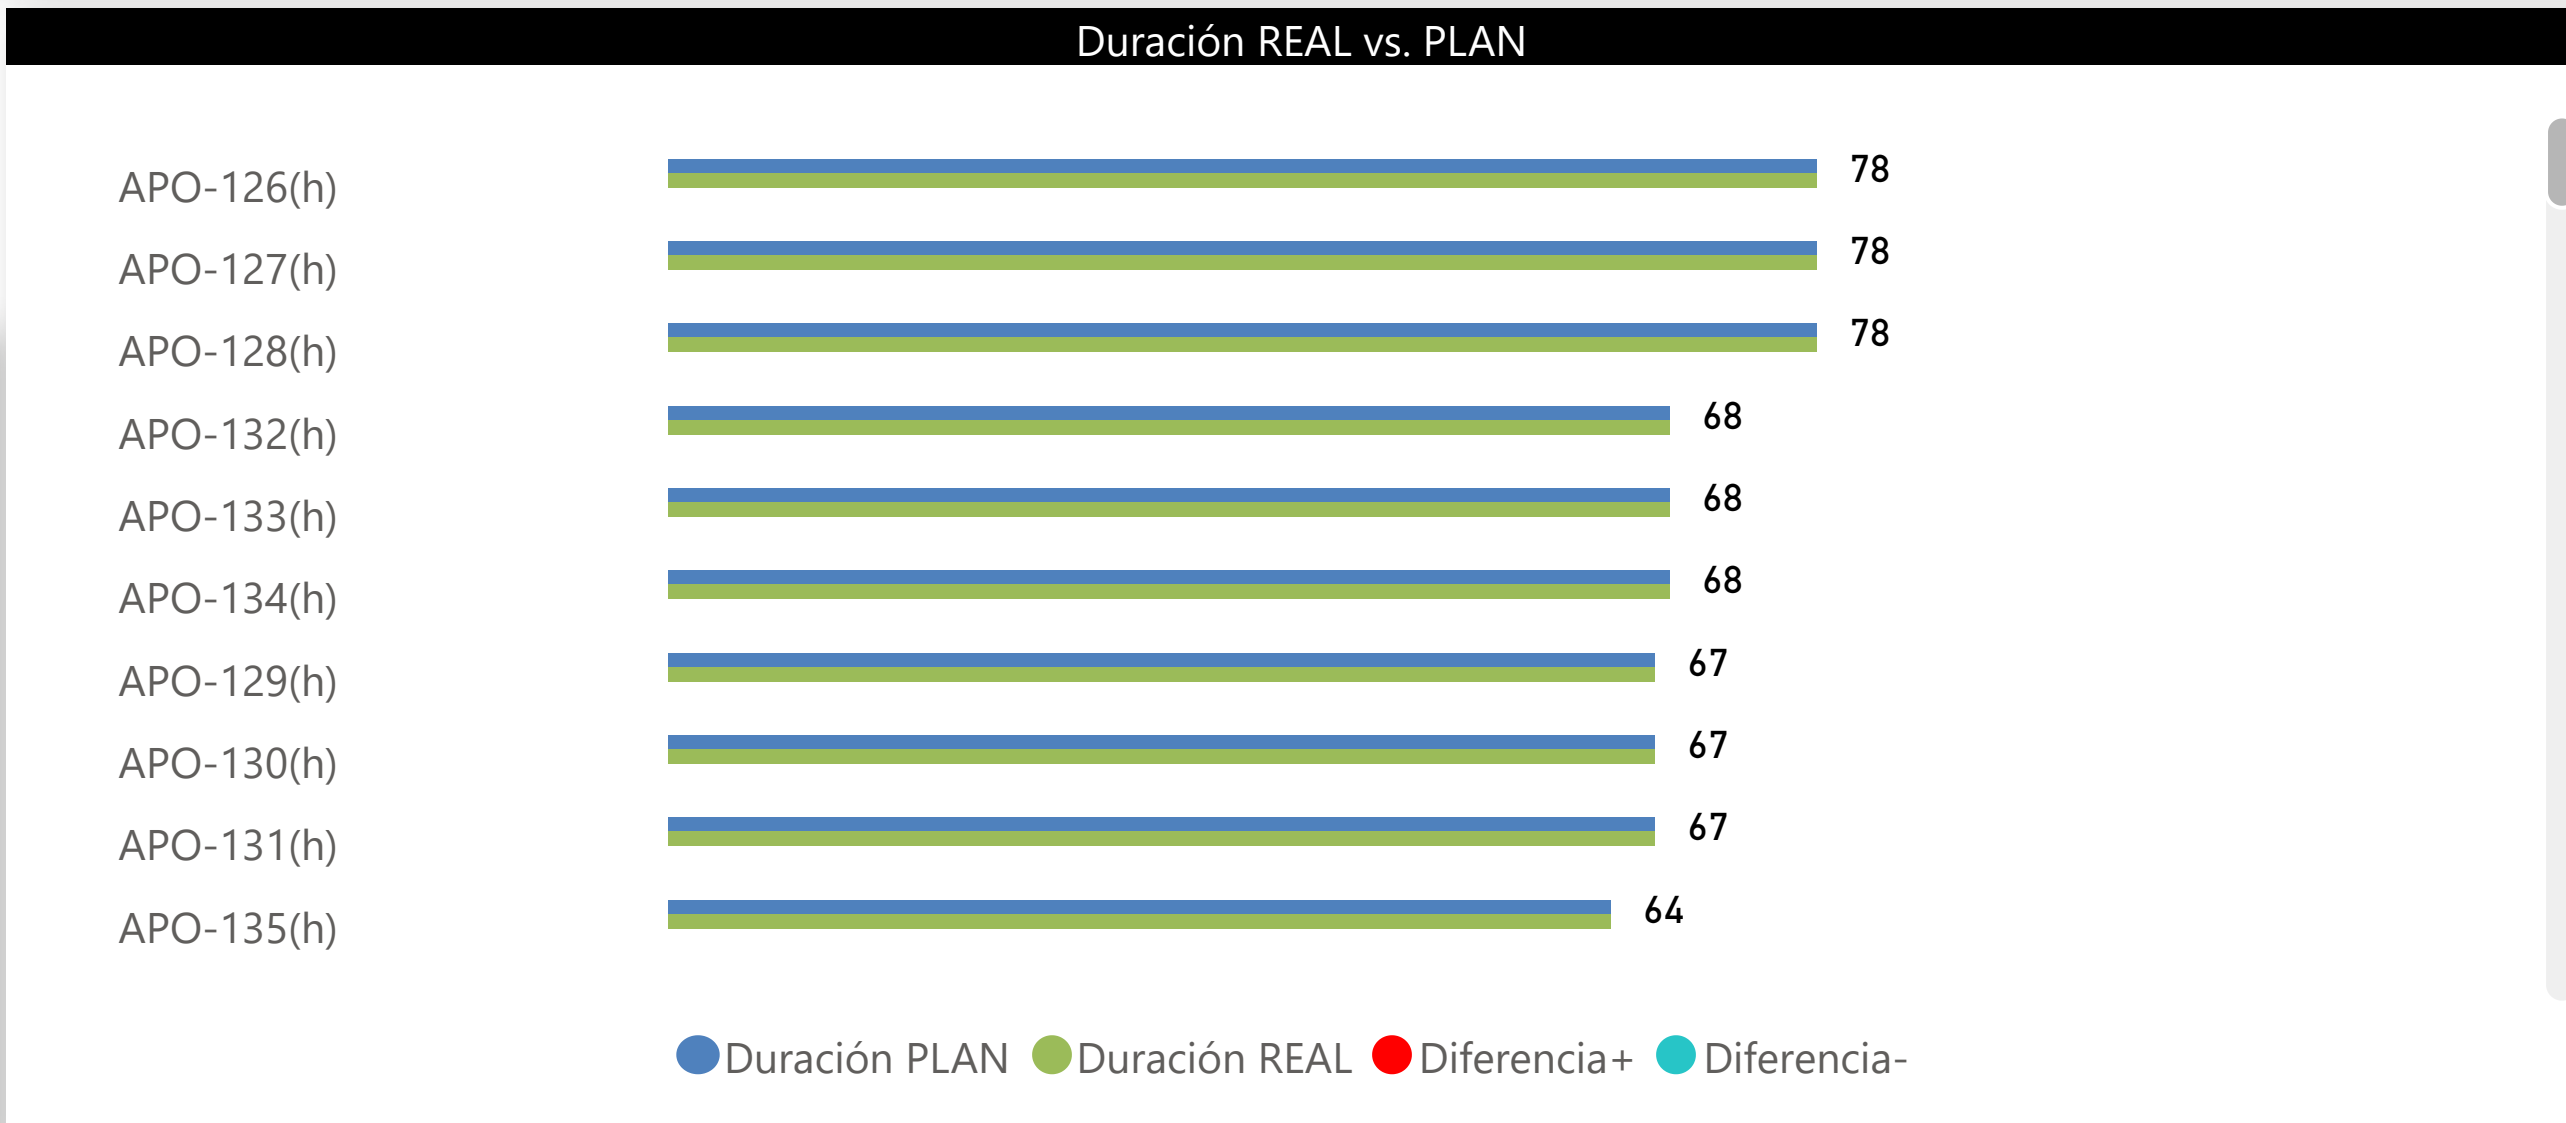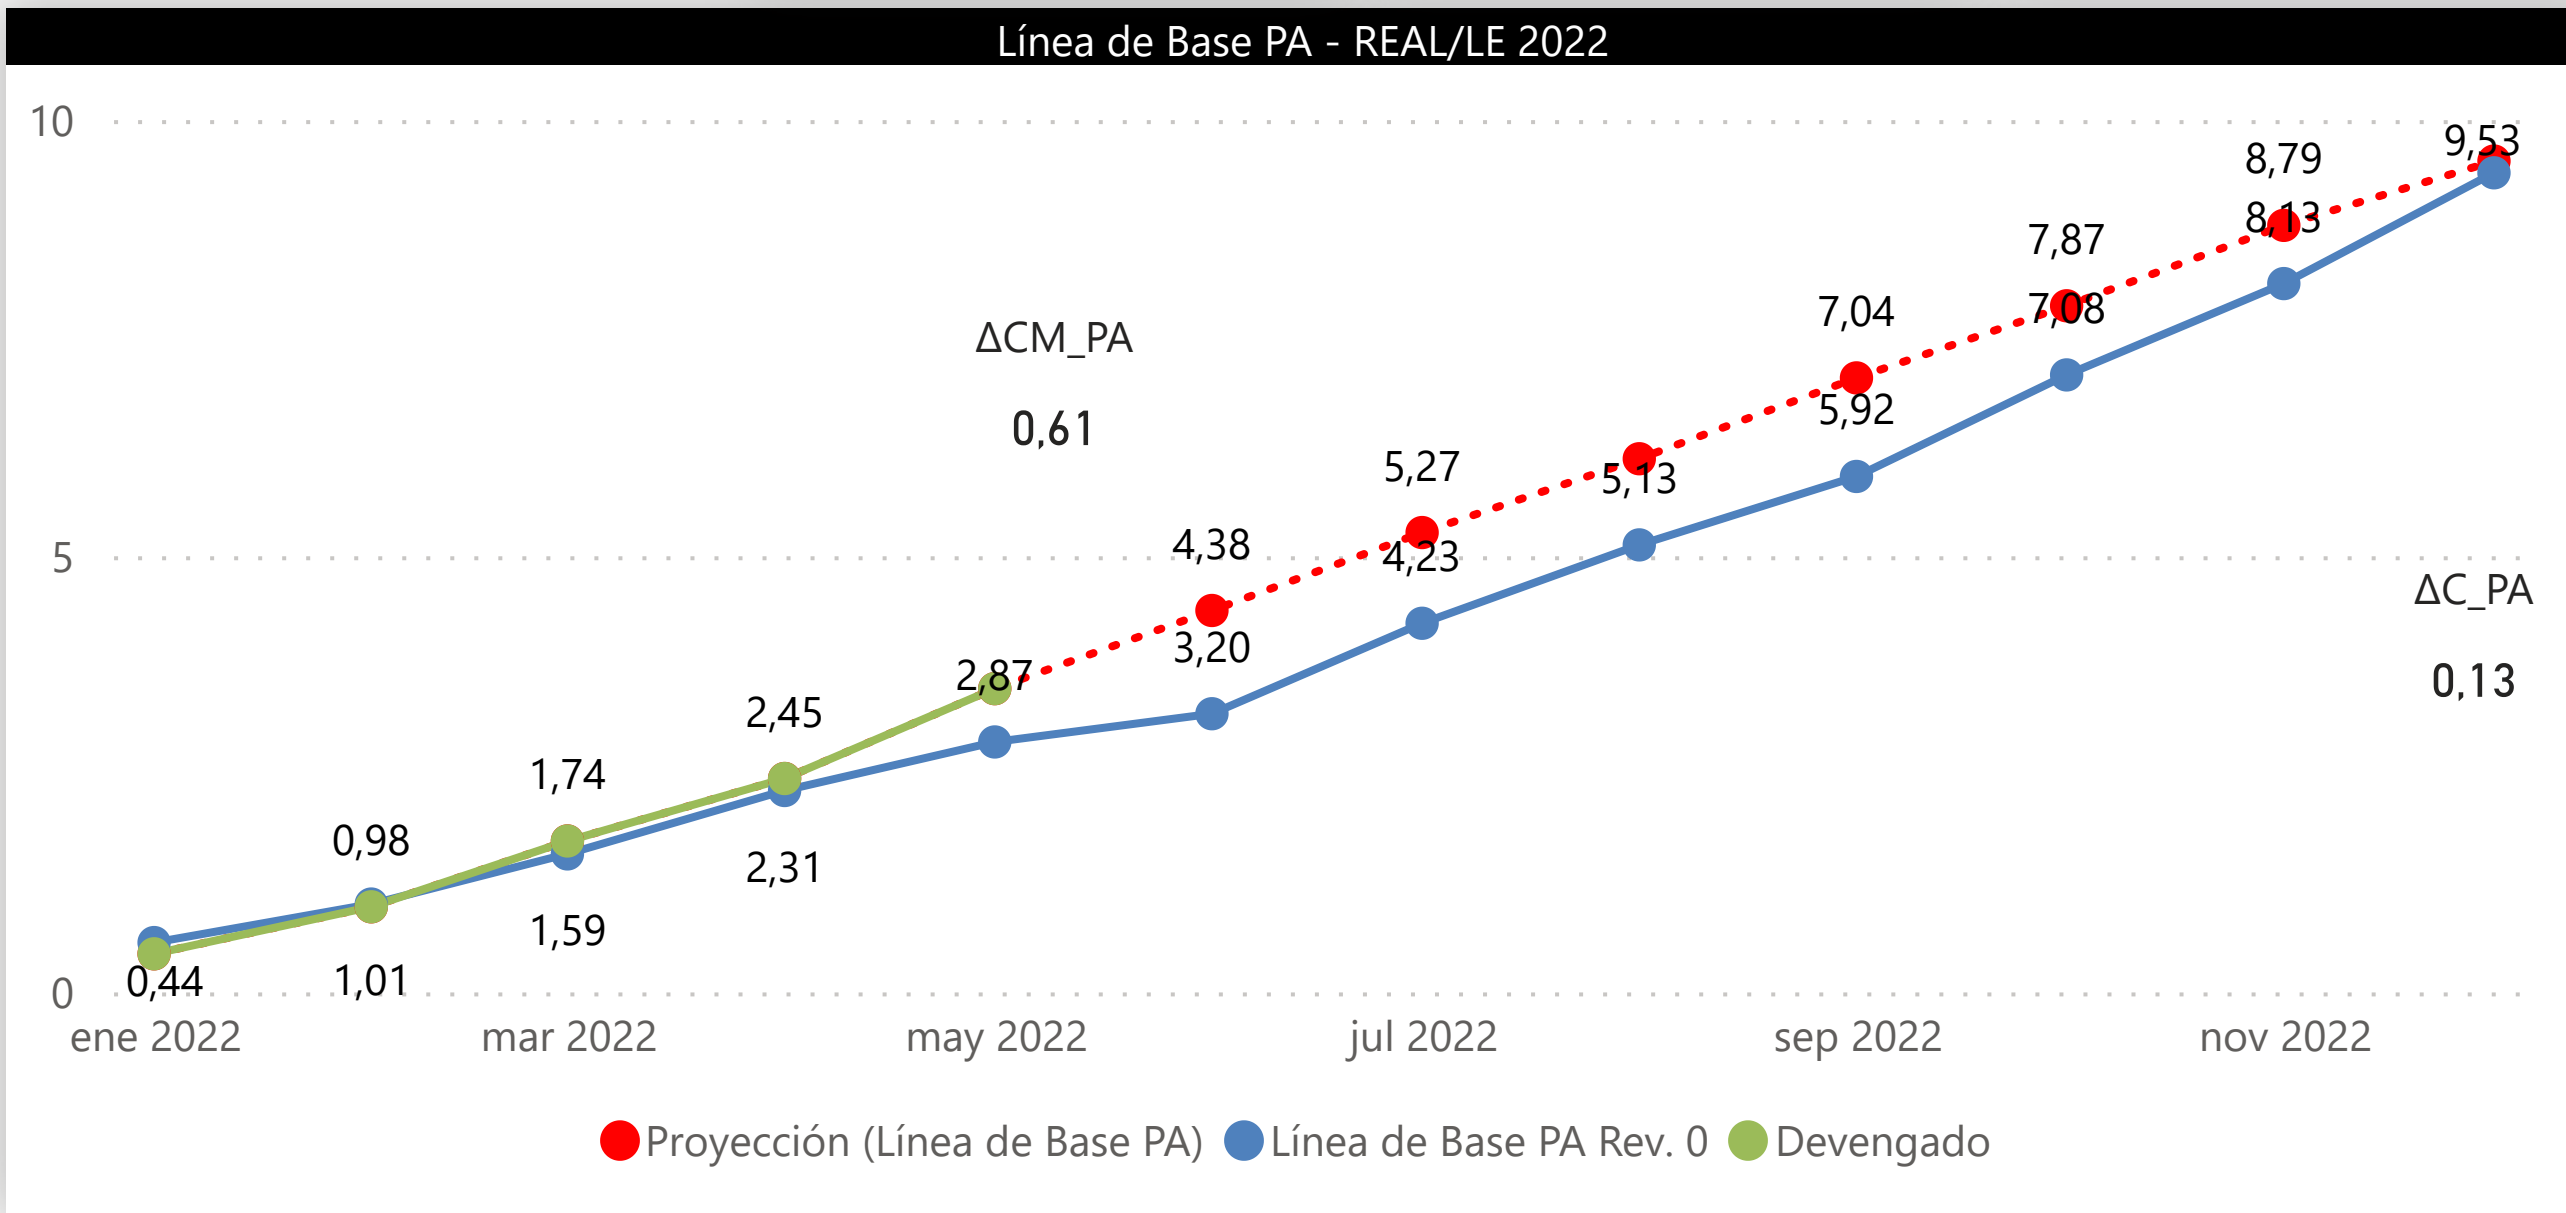


Tablero Completo														
Línea de Conducción		Locación												
Área	Well Pad	Pozo	Estado		21			68		68.3K		-8.73E-10		
Todas	Todas	Todas	Todas	Todas	Cant. WP			Cant. Pozos		Costo Prom.		Verificación		
TipoPozo	WP	Pozo	Tipo	Área	Contratista	PEP	Grafo	Avance	Estado	Fecha Inc.	Crono	Comienzo	Fin	enero
Línea de Conducción.APO-106(h)	WP007.APO	APO-106(h)	Línea de Conducción	Aguada Pichana Oeste	PLP SERVICIOS	EARAD/0163.5.01.003.03	2000025259	100 %	Finalizado	01/01/1900		31/07/2021	04/08/2021	
Línea de Conducción.APO-107(h)	WP007.APO	APO-107(h)	Línea de Conducción	Aguada Pichana Oeste	PLP SERVICIOS	EARAD/0163.5.01.004.03	2000025330	100 %	Finalizado	01/01/1900		31/07/2021	04/08/2021	
Línea de Conducción.APO-108(h)	WP007.APO	APO-108(h)	Línea de Conducción	Aguada Pichana Oeste	PLP SERVICIOS	EARAD/0163.5.01.005.03	2000025321	100 %	Finalizado	01/01/1900		31/07/2021	04/08/2021	
Línea de Conducción.APO-109(h)	APO06.APO	APO-109(h)	Línea de Conducción	Aguada Pichana Oeste	PLP SERVICIOS	EARAD/0163.5.01.001.03	2000027485	100 %	Finalizado	01/01/1900		13/12/2021	17/12/2021	
Línea de Conducción.APO-110(h)	APO06.APO	APO-110(h)	Línea de Conducción	Aguada Pichana Oeste	PLP SERVICIOS	EARAD/0163.5.01.002.03	2000028823	100 %	Finalizado	01/01/1900		13/12/2021	17/12/2021	
Línea de Conducción.APO-123(h)	WP010.APO	APO-123(h)	Línea de Conducción	Aguada Pichana Oeste	PLP SERVICIOS	EARAD/0163.5.01.019.03	2000030419	100 %	Finalizado	01/04/2022		31/12/1899	31/12/1899	
Línea de Conducción.APO-124(h)	WP010.APO	APO-124(h)	Línea de Conducción	Aguada Pichana Oeste	PLP SERVICIOS	EARAD/0163.5.01.020.03	2000030445	100 %	Finalizado	01/04/2022		31/12/1899	31/12/1899	
Línea de Conducción.APO-125(h)	WP010.APO	APO-125(h)	Línea de Conducción	Aguada Pichana Oeste	PLP SERVICIOS	EARAD/0163.5.01.021.03	2000030451	100 %	Finalizado	01/04/2022		31/12/1899	31/12/1899	
Línea de Conducción.APO-206(h)	WP017.APO	APO-206(h)	Línea de Conducción	Aguada Pichana Oeste	PLP SERVICIOS	EARAD/0163.5.01.015.03	2000030084	100 %	Finalizado	01/04/2022		26/03/2022	31/03/2022	
Línea de Conducción.APO-207(h)	WP017.APO	APO-207(h)	Línea de Conducción	Aguada Pichana Oeste	PLP SERVICIOS	EARAD/0163.5.01.016.03	2000030090	100 %	Finalizado	01/04/2022		26/03/2022	31/03/2022	
Línea de Conducción.APO-208(h)	WP017.APO	APO-208(h)	Línea de Conducción	Aguada Pichana Oeste	PLP SERVICIOS	EARAD/0163.5.01.017.03	2000030096	100 %	Finalizado	01/04/2022		26/03/2022	31/03/2022	
Línea de Conducción.CASE-506(h)	WP001.CASE	CASE-506(h)	Línea de Conducción	Coiron Amargo Sur Este	PLP SERVICIOS	EARAD/0161.5.01.007.03	2000025244	100 %	Finalizado	01/01/1900		13/09/2021	25/09/2021	
Línea de Conducción.CASE-508(h)	WP001.CASE	CASE-508(h)	Línea de Conducción	Coiron Amargo Sur Este	PLP SERVICIOS	EARAD/0161.5.01.008.03	2000025249	100 %	Finalizado	01/01/1900		13/09/2021	25/09/2021	
Línea de Conducción.CASE-510(h)	WP001.CASE	CASE-510(h)	Línea de Conducción	Coiron Amargo Sur Este	PLP SERVICIOS	EARAD/0161.5.01.009.03	2000025254	100 %	Finalizado	01/01/1900		13/09/2021	25/09/2021	
Línea de Conducción.Ech-107(h)	WP037.LA	Ech-107(h)	Línea de Conducción	Lindero Atravesado	PLP SERVICIOS	EARAD/0153.5.01.005.03	2000020011	100 %	Finalizado	01/01/1900		26/06/2021	30/06/2021	
Línea de Conducción.Ech-109(h)	WP037.LA	Ech-109(h)	Línea de Conducción	Lindero Atravesado	PLP SERVICIOS	EARAD/0153.5.01.007.03	2000020047	100 %	Finalizado	01/01/1900		26/06/2021	30/06/2021	
Locación.ACa-103(h)	WP001.ACA	ACa-103(h)	Locación	Aguada Canepa	ZILLE	EARAX/0015.5.01.002.05	2000026408	100 %	Finalizado	01/01/1900		22/03/2021	21/05/2021	
Locación.ACa-104(h)	WP001.ACA	ACa-104(h)	Locación	Aguada Canepa	ZILLE	EARAX/0015.5.01.003.05	2000026413	100 %	Finalizado	01/01/1900		22/03/2021	21/05/2021	
Locación.ACas-104(h)	WP017.ACAS	ACas-104(h)	Locación	Aguada de castro	CN SAPAG SA			100 %	Finalizado	01/01/1900		13/10/2020	12/01/2021	
Locación.ACas-105(h)	WP017.ACAS	ACas-105(h)	Locación	Aguada de castro	CN SAPAG SA			100 %	Finalizado	01/01/1900		13/10/2020	12/01/2021	
Locación.ACas-106(h)	WP017.ACAS	ACas-106(h)	Locación	Aguada de castro	CN SAPAG SA			100 %	Finalizado	01/01/1900		13/10/2020	12/01/2021	
Locación APO-106(h)	WP007.APO	APO-106(h)	Locación	Aguada Pichana Oeste	CN SAPAG SA	EARAD/0163.5.01.003.05	2000025329	100 %	Finalizado	01/01/1900		27/08/2020	08/10/2020	
Total														57
<														>

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PA	0,57	1,01	1,59	2,31	2,87	3,20	4,23	5,13	5,92	7,08	8,13	9,40
LE	0,44	0,98	1,74	2,45	3,48	4,38	5,27	6,12	7,04	7,87	8,79	9,53



Plan	LE	Plan Acum.	Real Acum.	Desvío ΔC%_PA	Desvío YTD ΔCM%_PA	Variación de la Cartera			ΔC_PA	ΔCM_PA
9.40 MMUSD	9.53 MMUSD	2.87 MMUSD	3.48 MMUSD	1.4 %	15.9 %	Costo	Alcance	Desliz	0,13	0,61
						2.29 %	-0.86 %	0.00 %		

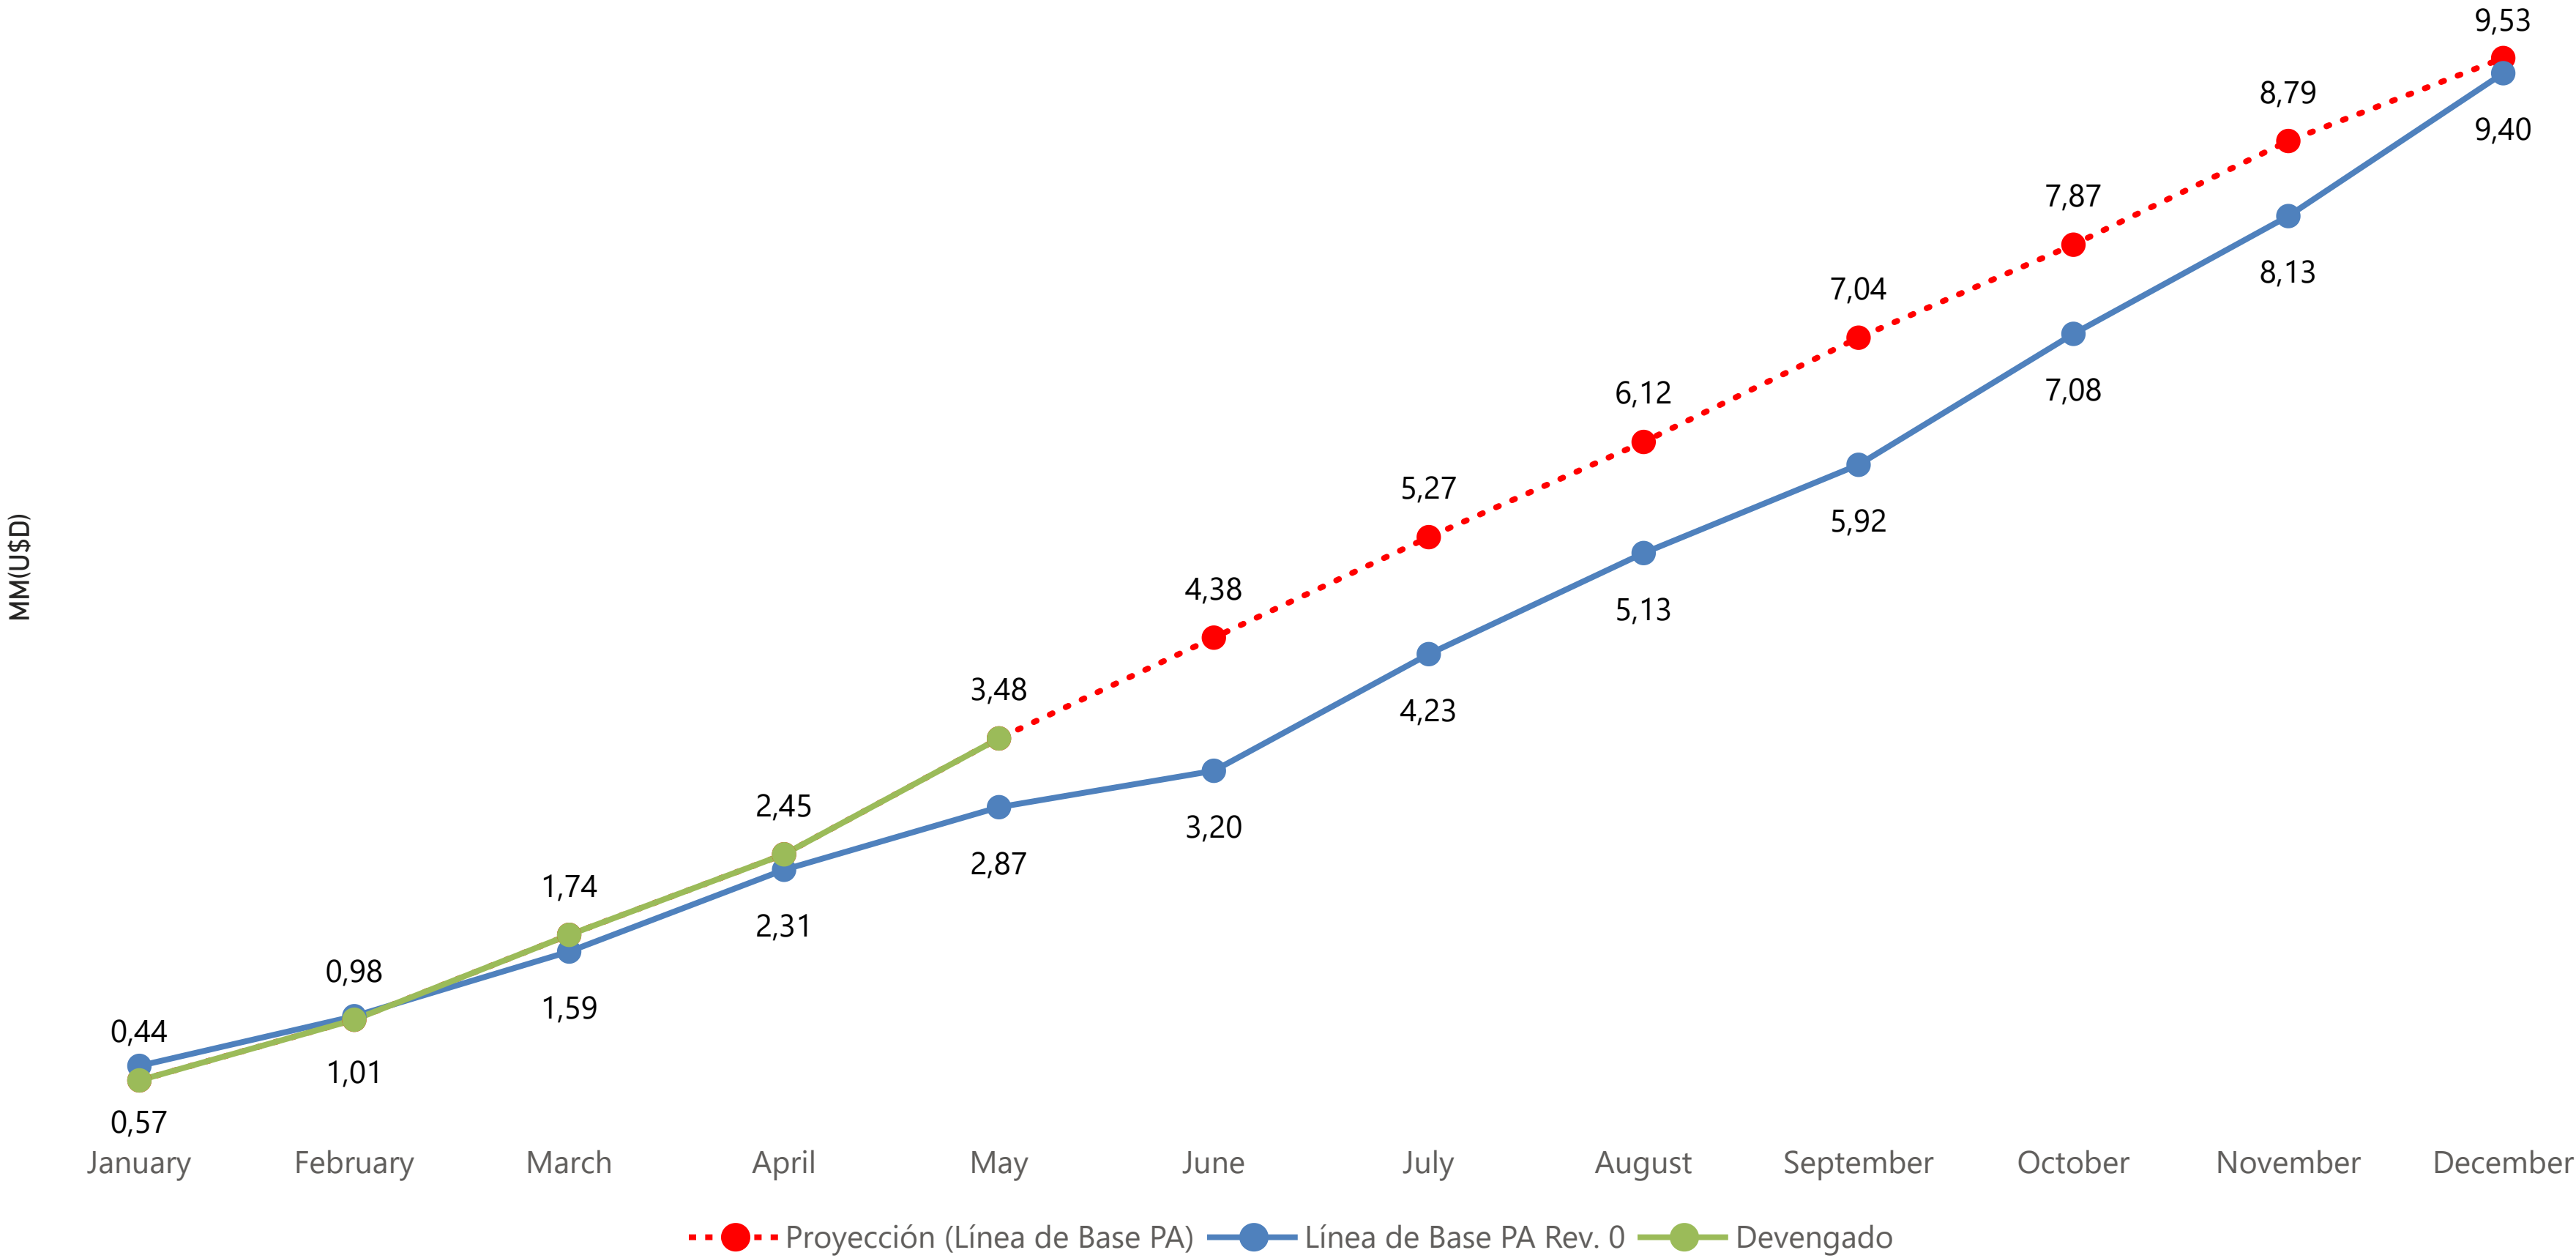

Línea de Conducción

Locación

Aguada Canepa

Aguada de
castro

Aguada Pichana
Oeste

Bandurria
Centro

Coiron Amargo
Sur Este

Lindero
Atravesado
